

JEUDI

	 5-15 km/h	 0,0 mm
T _{min} : 9°C T _{max} : 19°C		

DIMANCHE

	 10 km/h	 0,0 mm
T _{min} : 12°C T _{max} : 20°C		

VENDREDI

	 5-10 km/h	 0,0 mm
T _{min} : 9°C T _{max} : 21°C		

LUNDI

	 10 km/h	 0,8 mm
T _{min} : 10°C T _{max} : 17°C		

SAMEDI

	 5-10 km/h	 0,0 mm
T _{min} : 11°C T _{max} : 21°C		


MARDI

	 10-15 km/h	 0,2 mm
T _{min} : 11°C T _{max} : 20°C		

Après un début de mois plutôt maussade, le ciel se découvre peu à peu. De belles éclaircies sont attendues dès demain jeudi et un temps bien ensoleillé perdurera jusqu'au week-end. A partir de dimanche un retour des nuages est prévu et quelques ondées seront possibles lundi.

Les températures restent fraîches le matin avec 9 à 12 °C prévus. Les 20°C devraient être atteint l'après-midi. La journée de lundi prochain risque d'être la plus fraîche avec 17°C seulement l'après-midi.

Le vent reste majoritairement de secteur nord et les rafales ne dépasseront pas les 15 km/h en moyenne.

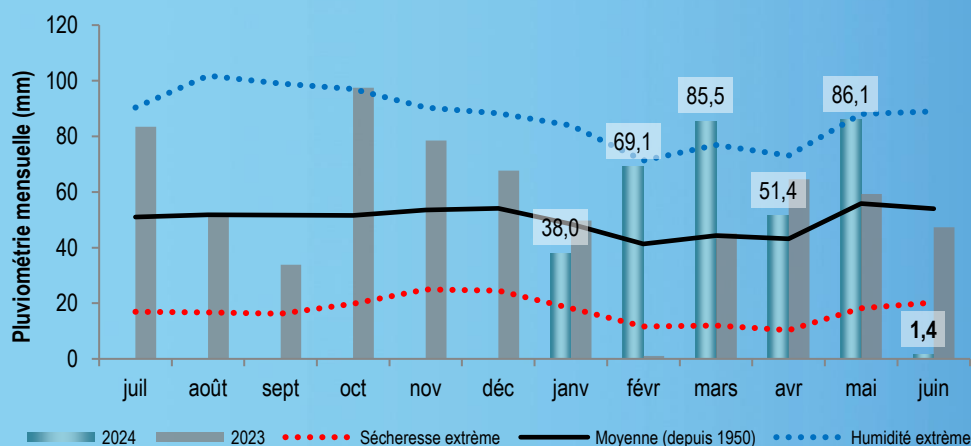

Les derniers jours de mai particulièrement arrosés sur le territoire ont fait grimper le cumul mensuel à plus de 86 mm, soit une valeur nettement supérieure à la moyenne.


Après quelques épisodes pluvieux ces derniers jours, le mois de juin est pour le moment annoncé comme plutôt sec.

Les modèles de prévisions à 3 mois annoncent un temps plus chaud que la moyenne.

Valeur au
02/06/2024
114,19 mNGF
+ 4 cm



Niveau de recharge de la nappe

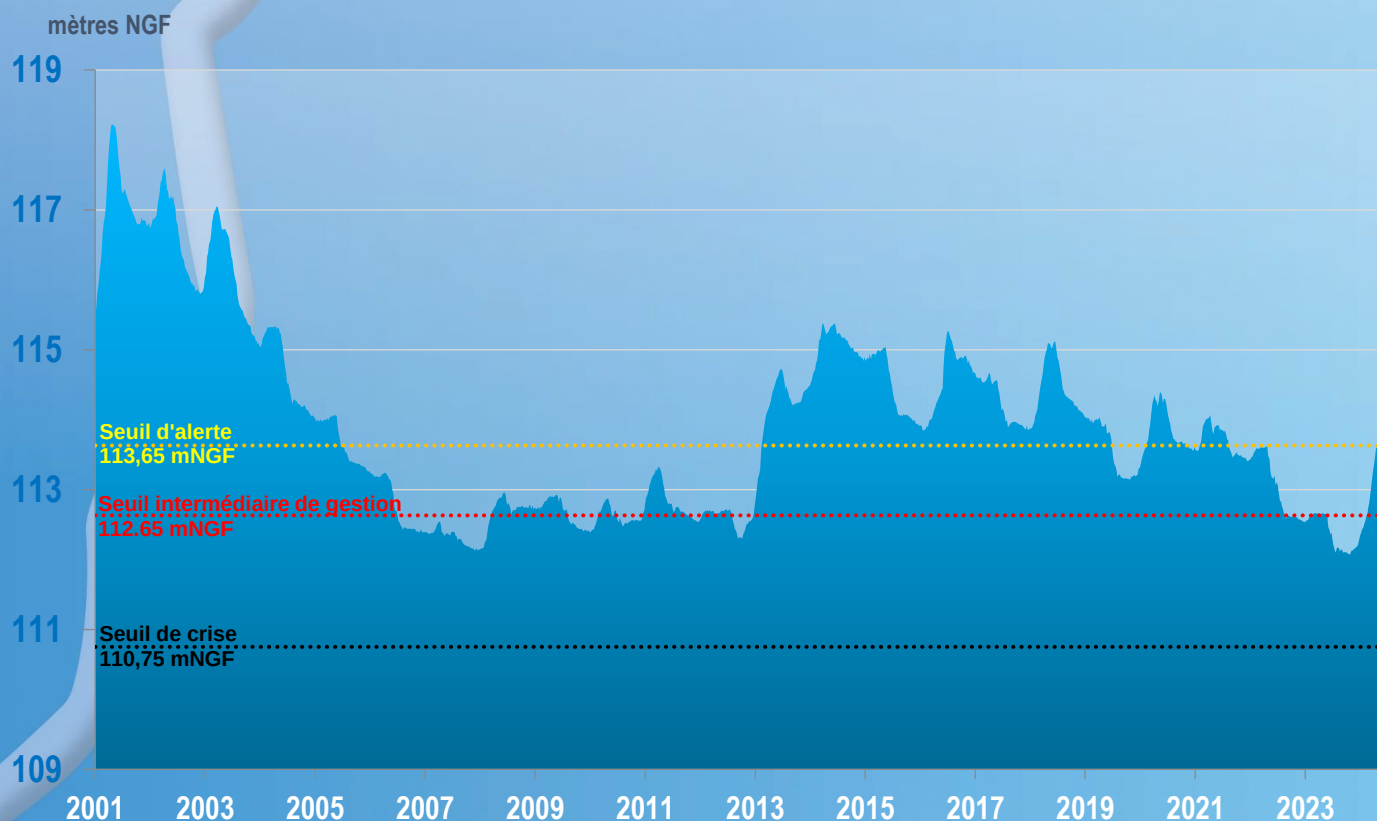

TENDANCE DU SUIVI PIEZOMETRIQUE DU SIARCE au 15 mai 2024




Bien que l'été se rapproche, l'indice de la nappe de Beauce continue d'augmenter avec encore 4 centimètres de gagnés par rapport à la semaine passée.

L'impact des prélèvements sur la ressource n'est pour le moment pas visible, et la période de recharge tardive se poursuit.

Valeur au
05/06/2024
8,1 m³/s

L'ESSONNE

Débits moyens journaliers observés à Ormoy

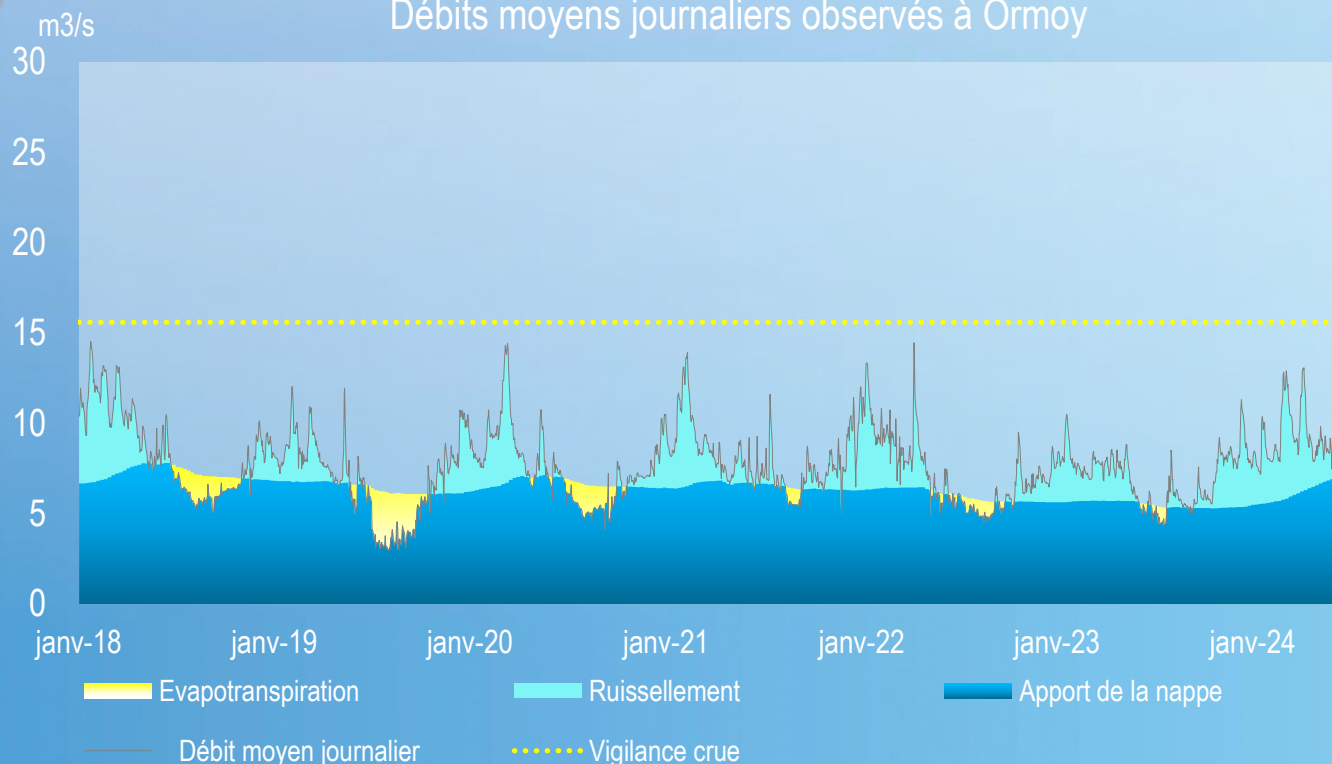

Prévisions de la semaine

	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi
Débit prévu à Ormoy (m ³ /s)	8,8	8,5	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
CRUE/ETIAGE							

Le débit de la rivière Essonne reste stable avec une valeur sur l'aval proche des 8 m³/s.


Sur les différentes stations du territoire on observe les tendances suivantes :

- Boulancourt : dernier relevé à 16h avec un débit à 1,58 m³/s, tendance stable
- Guigneville-sur-Essonne : dernier relevé à 17h avec un débit à 4,07 m³/s, tendance stable
- Ballancourt-sur-Essonne : dernier relevé à 17h avec un débit à 8,2 m³/s, tendance à la baisse

Valeur au
05/06/2024
251 m³/s



Débit moyen journalier de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry (Source : Vigicrues)

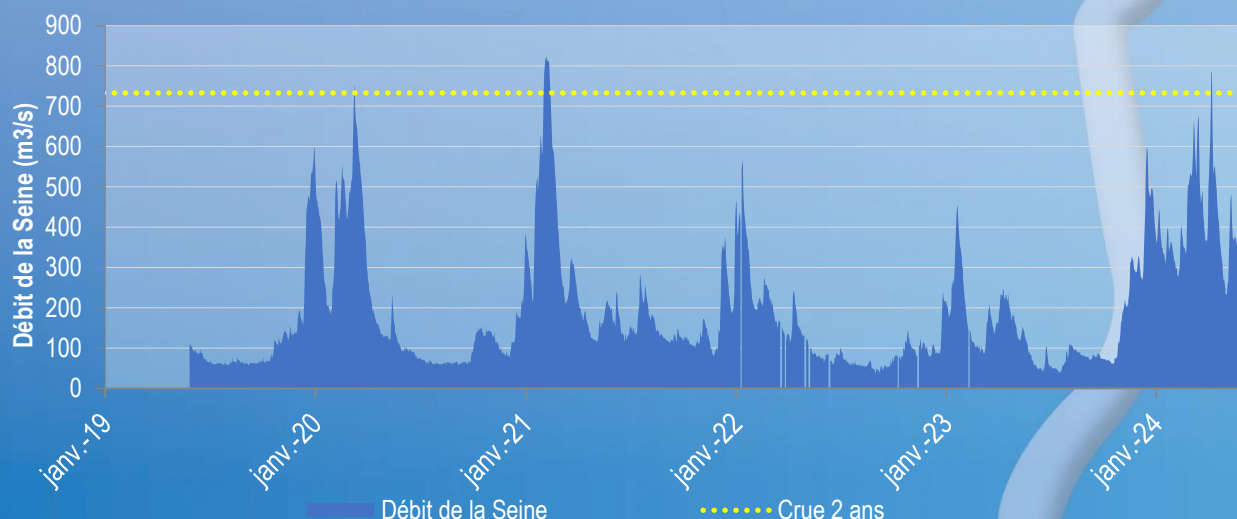

Le débit moyen de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry poursuit sa baisse cette semaine avec 251 m³/s mesurés actuellement sur la station.

Les prévisions sont visibles sur le site de Vigicrue : <https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=7>


REPLISSAGE DES GRANDS LACS RESERVOIRS

Lac de la Marne


Lacs de l'Aube

Lac de Seine


Lac de l'Yonne

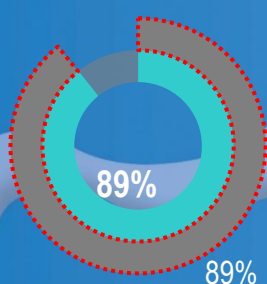


89%

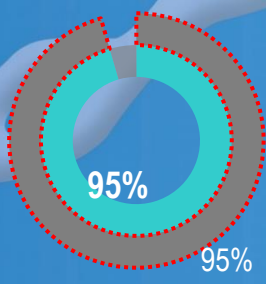

95%

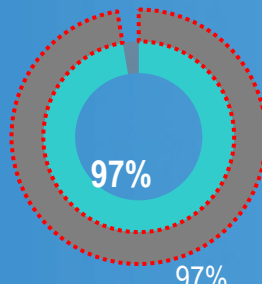

97%

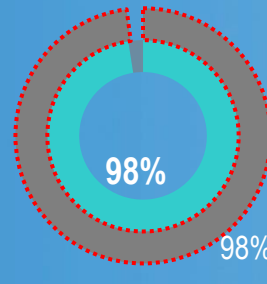

98%

Remplissage théorique

Le remplissage des grands lacs réservoir reste stable cette semaine avec des taux de remplissage proches des maximum possibles pour ces ouvrages. Avec le retour d'un temps plus calme, le démarrage de la vidange estivale devrait pouvoir être lancé dans les semaines à venir.

TRAVAUX

Légende



Corbeil-Essonnes

Travaux d'entretien de la végétation sur la digue du Quai Apport Paris.

13/06/24-27/06/24 (à venir)



Travaux Milieux Aquatiques



Travaux Assainissement



Travaux Eau Potable



Menecy

Rue des Chatries

- Remplacement de 90 ml de canalisations d'eaux usées (EU) et d'eaux pluviales (EP) ainsi que 8 branchements EU et EP
- Réhabilitation sans tranchée de 260 ml de canalisation EU et EP
- Renouvellement de 70ml de canalisation d'alimentation en eau potable.

Depuis le 24/04/2024 (en cours)



La Ferté-Alais

Travaux de sécurisation du réseau d'eau potable avec création d'un by-pass de diamètre 150 mm.

15/01/24-15/06/24 (en cours)



Vayres-sur-Essonne

2 rue de la Ruchère

- Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement phase 2 – env. 100 ml (6 mai – 31 mai 2024)

