LE BULLETIN DE L'EAU

LE POINT MÉTÉO

Du 23 au 29 juillet 2025

JEUDI

5-10 km/h

28.2 mm

T_{min} : 15°C T_{max} : 21°C

DIMANCHE

10-20 km/h

5.4 mm

T_{min} : 16°C T_{max} : 24°C

VENDREDI

10-15 km/h

2.9 mm

T_{min} : 14°C T_{max} : 26°C

LUNDI

10-15 km/h

0.6 mm

T_{min} : 16°C T_{max} : 24°C

SAMEDI

5-15 km/h

0.0 mm

T_{min} : 16°C T_{max} : 26°C

MARDI

10-20 km/h

0.0 mm

T_{min} : 15°C T_{max} : 24°C

Une ligne de perturbations à caractère orageux approche le territoire par l'ouest. Elle apportera de fortes précipitations entre mercredi et jeudi, avec 20 à 30 mm de cumul attendus sur les 24 prochaines heures. Un retour au calme est prévu à partir de vendredi midi. Quelques ondées seront également possibles dans la journée de dimanche.

Les températures ont perdu plus de 10°C par rapport à la semaine passée. Les matinées sont fraîches avec 14 à 16 °C et ne dépassent pas les 26 °C l'après-midi.

Le vent restera en secteur nord-ouest au moins jusqu'à mardi prochain.

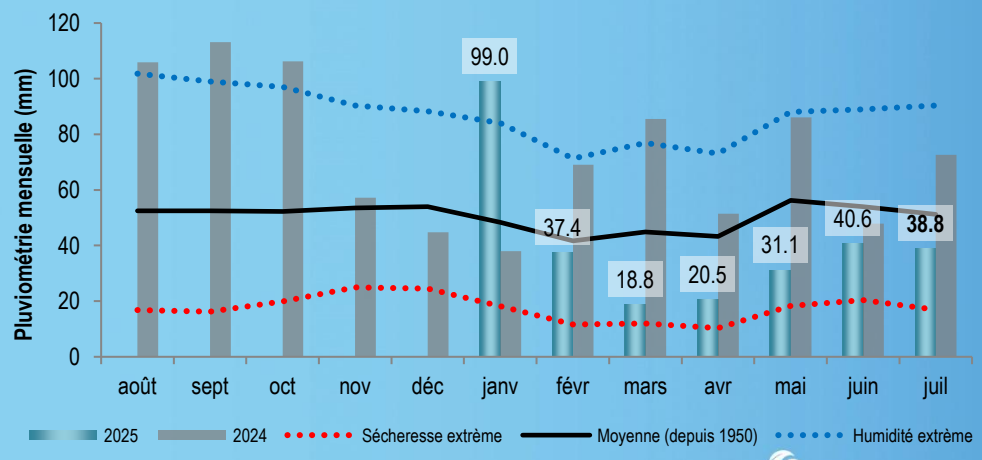

Le cumul pluviométrique du mois de juillet affiche d'ores et déjà une valeur proche de la moyenne mensuelle avec plus de 38 mm enregistrés sur le territoire.

Les fortes précipitations attendues à partir de la soirée devraient faire nettement augmenter cette valeur et se rapprocher des conditions d'un mois très humide.

SEMAFORE Siarce

Valeur au

20/07/2025

*115.87 mNGF**

- 0 cm

NAPPE DE BEAUCE

Niveau de recharge de la nappe

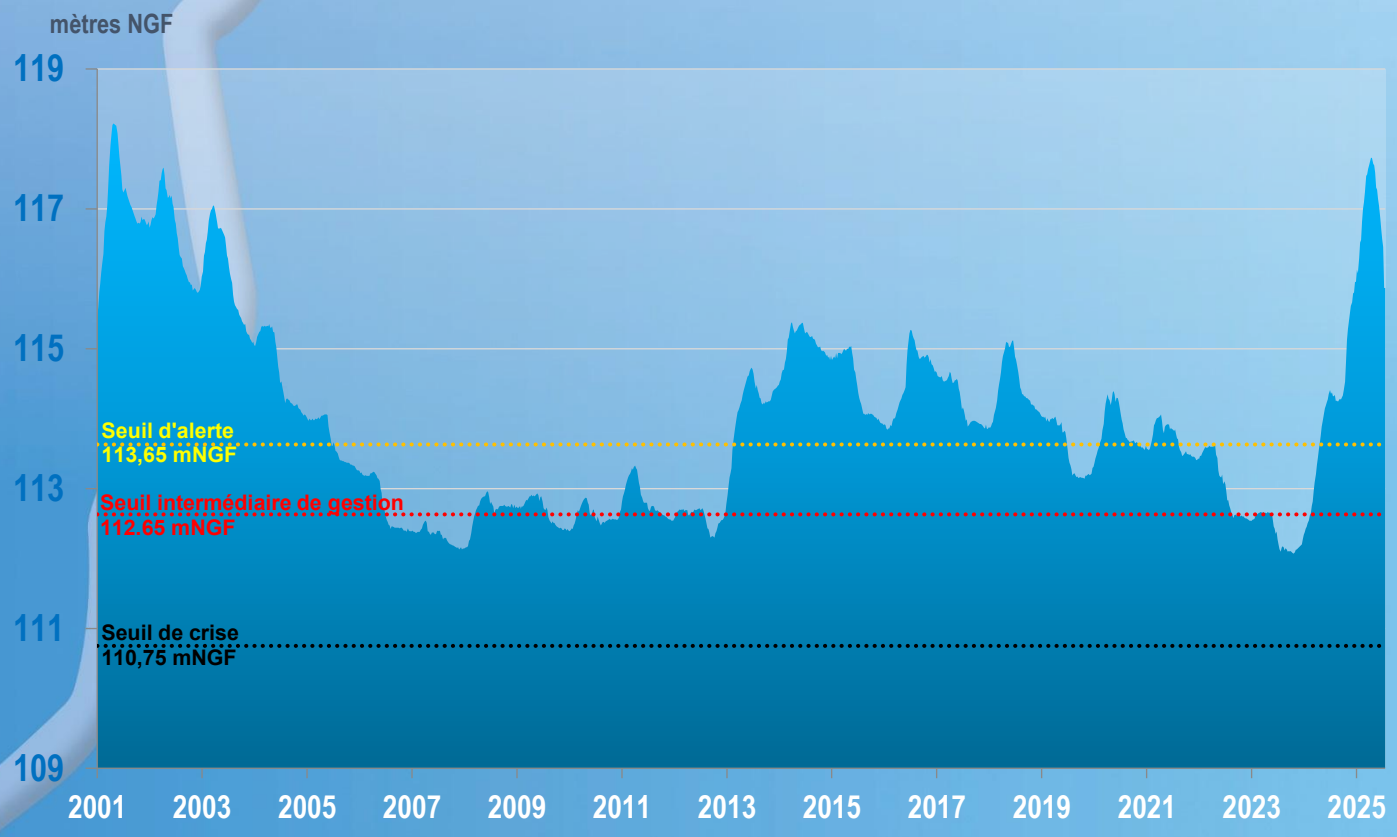

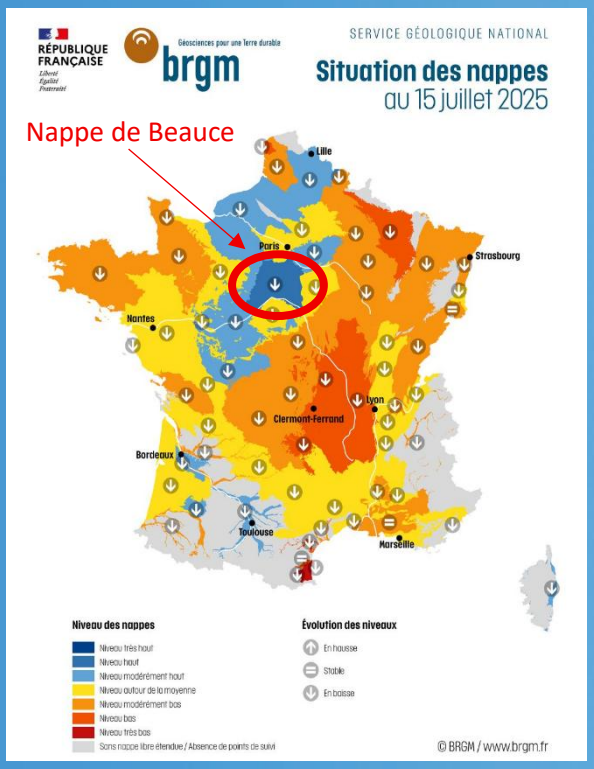

**En raison de valeurs erronées sur l'une des stations de mesure de l'indice, ce dernier n'a été qu'estimé. Il sera mis à jour dès que possible.*

Compte-tenu des difficultés rencontrées sur l'une des stations de mesure, il est possible que l'importante diminution de l'indice observée depuis deux semaines soit réévaluée dans les jours à venir.

La condition hydrogéologique de la nappe de Beauce reste satisfaisante au 15 juillet avec un remplissage qui reste au-dessus de la moyenne pour la saison.

SEMAFORE Siarce

**NGF Nivellement Général de la France*

Valeur au

22/07/2025

7.5 m³/s

L'ESSONNE

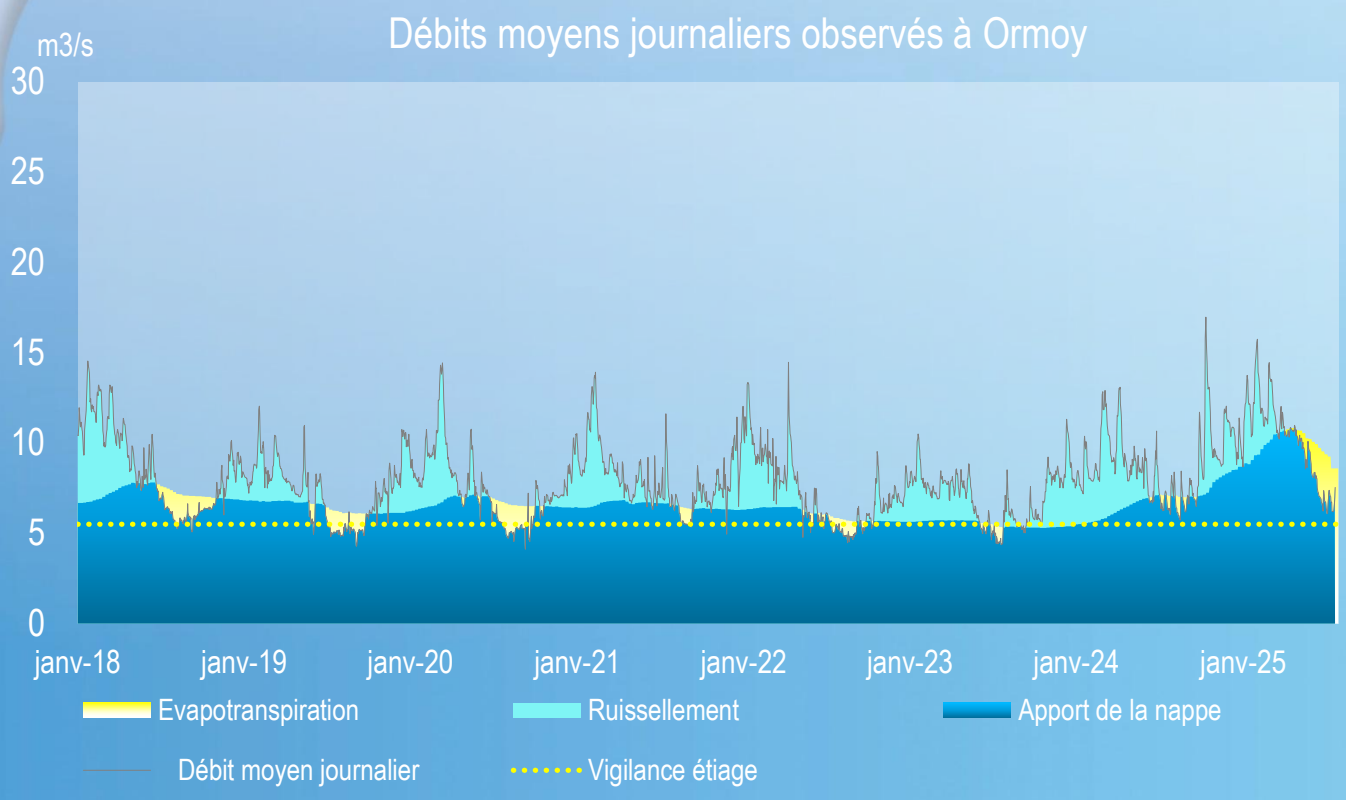

Prévisions de la semaine

	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi
Débit prévu à Ormoy (m3/s)	7.7	8.5	9.1	9.3	9.4	9.7	9.7
CRUE/ETIAGE							

Après une stabilisation des débits, les précipitations de la semaine passée ont entrainé une hausse modérée des niveaux sur l'ensemble du territoire. Compte-tenu des prévisions attendues pour les prochaines 24h, une nouvelle augmentation du débit de la rivière est attendue. Son amplitude sera surveillée.

Sur les différentes stations du territoire on observe les tendances suivantes par rapport à la semaine passée :

- Boulancourt : dernier relevé le 23/07 à 14h avec un débit à 1.65 m³/s, augmentation attendue,
- Guigneville-sur-Essonne : dernier relevé le 23/07 à 14h avec un débit à 3.45 m³/s, augmentation attendue,
- Ballancourt-sur-Essonne : dernier relevé le 23/07 à 14h20 avec un débit à 7.45 m³/s, augmentation attendue.

SEMAFORE Siarce

Valeur au

22/07/2025

69 m3/s

LA SEINE

Débit moyen journalier de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry (Source : Vigicrues)

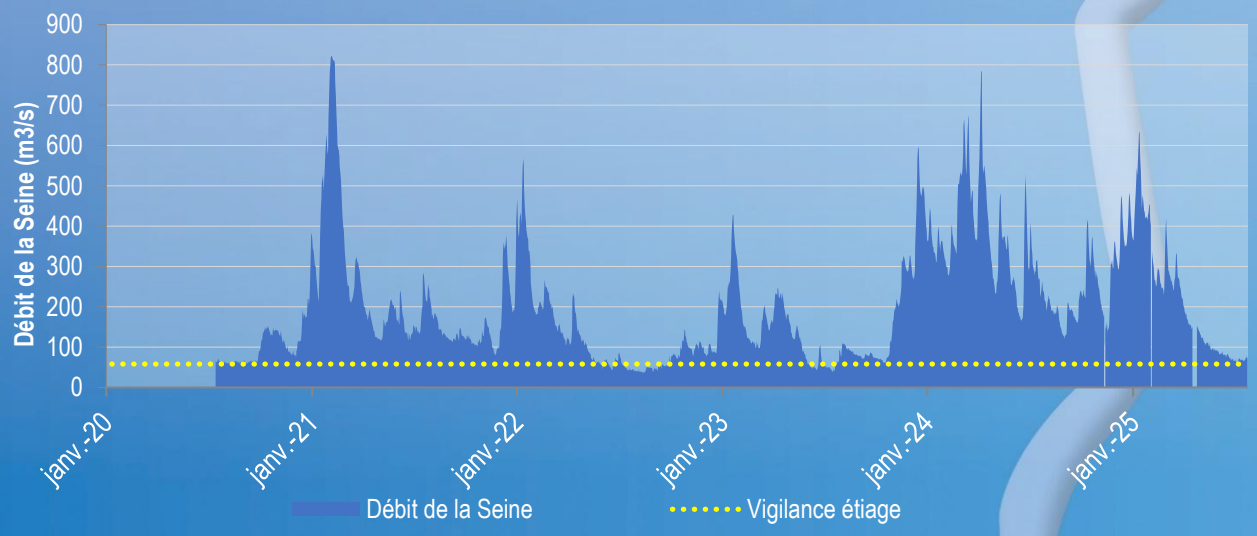

Sur l'axe Seine, la situation reste stable avec un débit moyen proche de l'étiage, sans dépassement des conditions de sécheresse pour le moment.

Les prévisions sont visibles sur le site de Vigicrue : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=7

REMPLISSAGE DES GRANDS LACS RESERVOIRS

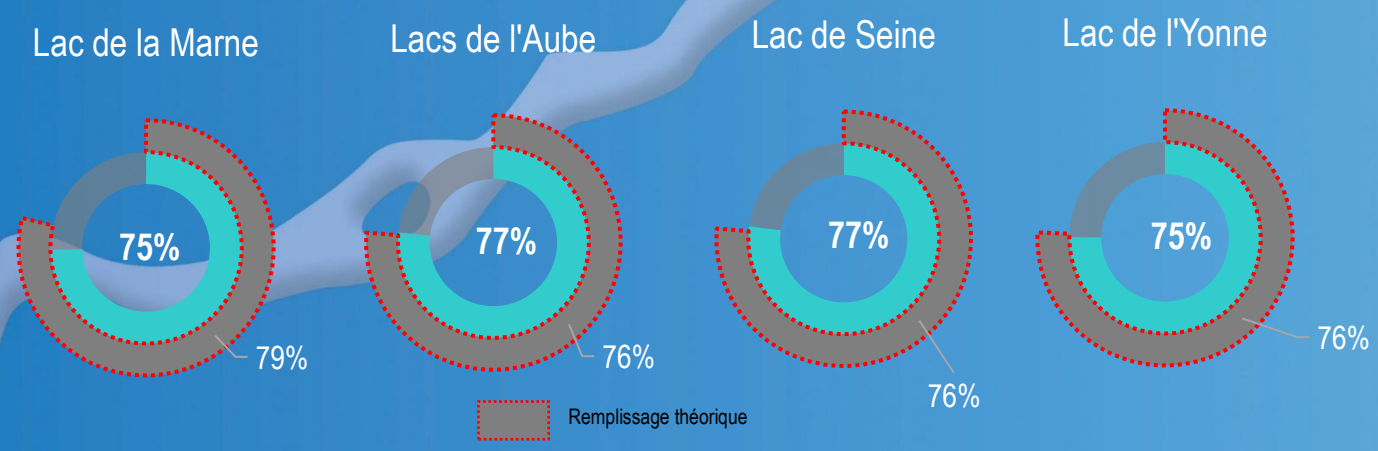

Les lacs réservoirs poursuivent leur vidange, en accord avec leurs taux de remplissages théoriques. Le lac de la Marne conserve un taux de remplissage légèrement inférieur au taux prévisionnel.

SEMAFORE Siarce

TRAVAUX

Rivière Essonne

Programme pluriannuel d'entretien

Diagnostic de la rivière Essonne pour la réalisation des travaux d'entretien estivaux (en cours)

Légende

Travaux Milieux Aquatiques

Travaux Assainissement

Travaux Eau Potable

Boissy-sous-Saint-Yon

Rue de Béchevret

Renouvellement du réseau d'eau potable sur 540 ml

18/08/2025-19/12/2025 (à venir)

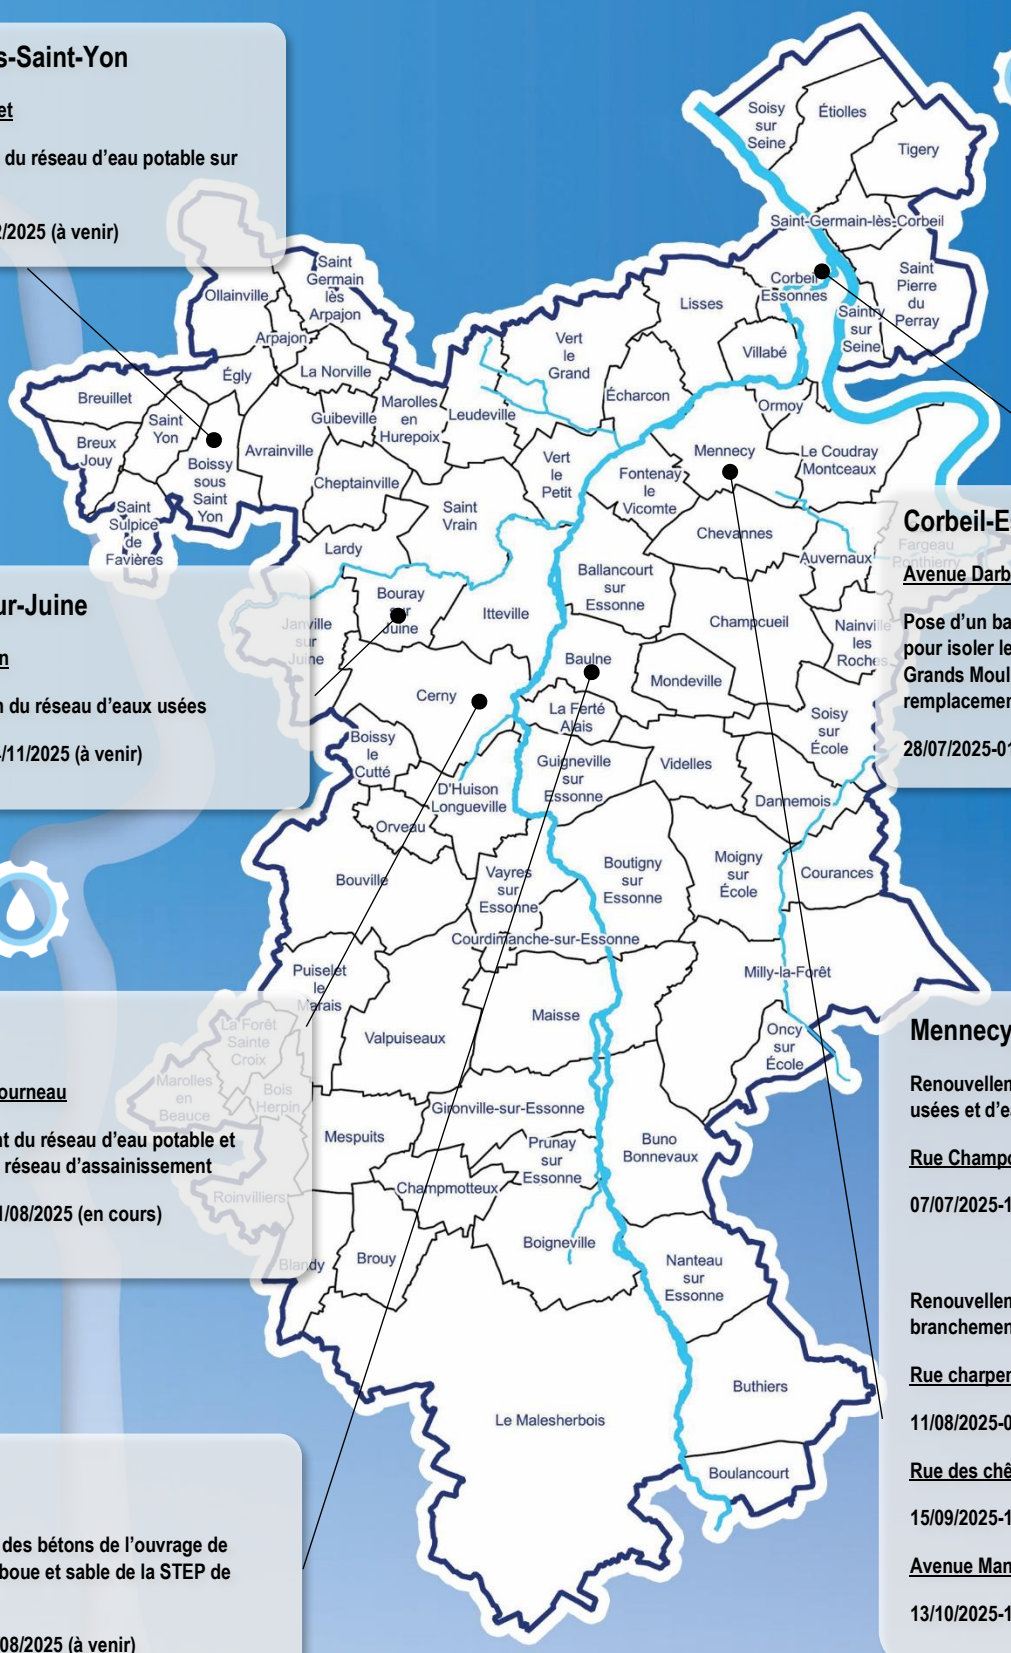

Bouray-sur-Juine

Rue du Moulin

Réhabilitation du réseau d'eaux usées

04/08/2025-04/11/2025 (à venir)

Corbeil-Essonnes

Avenue Darblay

Pose d'un batardeau sur la rivière Essonne pour isoler le bras droit de l'ouvrage des Grands Moulins de Corbeil, en prévision du remplacement de la vanne

28/07/2025-01/08/2025 (à venir)

Cerny

Chemin du Fourneau

Renforcement du réseau d'eau potable et extension du réseau d'assainissement

16/07/2025-01/08/2025 (en cours)

Mennecy

Renouvellement des canalisations d'eaux usées et d'eau potable

Rue Champoreux

07/07/2025-15/08/2025 (en cours)

Renouvellement de canalisations et de branchements d'eau potable

Rue charpentier

11/08/2025-05/09/2025 (à venir)

Rue des chênes

15/09/2025-10/10/2025 (à venir)

Avenue Manassé

13/10/2025-18/11/2025 (à venir)

Baulne

Réhabilitation des bétons de l'ouvrage de prétraitement boue et sable de la STEP de Baulne

01/08/2025-31/08/2025 (à venir)

SEMAFORE Siarce
